

Etat d'avancement des marchés de l'opération du 17/09/2015 au 31/12/2016

Opération : BRIEY_CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE CERTIFIE HQE_CTDD

Famille d'opération : Production

Nature d'opération : Travaux

Etat : En cours


Statut : Hors ANRU

Maitre d'ouvrage : Conseil Général de Meurthe et Moselle

Maitre d'ouvrage délégué :

Num Marché Clause	Marché Clause	Adjudicataire	Début	Fin	Heures Prévues	Heures réalisées sur la période	Heures Restantes	Dépassement d'heures	% Heures Réalisées / Prévues	Colonne1	Colonne2
01	Terrassement / aménagements extérieurs	EUROVIA LORRAINE - BRIEY	17/09/2015	31/12/2016	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00%		
02	Gros oeuvre	ZANNIER CONSTRUCTIONS (WZ CONSTRUCTIONS)	17/09/2015	31/12/2016	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00%		
03	Etanchéité	SMAC	17/09/2015	31/12/2016	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00%		
04	Menuiseries extérieures	LEFEVRE	17/09/2015	31/12/2016	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00%		
05	Parement de façade	PRO FACADE SARL	17/09/2015	31/12/2016	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00%		
06	Menuiserie intérieure, plâtrerie, faux plafonds	WUCHER MENUISERIE	17/09/2015	31/12/2016	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00%		
07	Revêtements de sols et peinture	DEBRA FRERES	17/09/2015	31/12/2016	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00%		
08	Chauffage, ventilation, climatisation	IDEX ENERGIES (Bar-le-Duc)	17/09/2015	31/12/2016	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%		
09	Plomberie	LORRY	17/09/2015	31/12/2016	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00%		
10	Electricité	EGIL	17/09/2015	31/12/2016	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00%		
11	Ascenseur	KONE	17/09/2015	31/12/2016	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00%		
12	Brise soleil	LEFEVRE	17/09/2015	31/12/2016	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00%		
Total					2 449,00	0,00	2 449,00	0,00			0,00%

Marchés

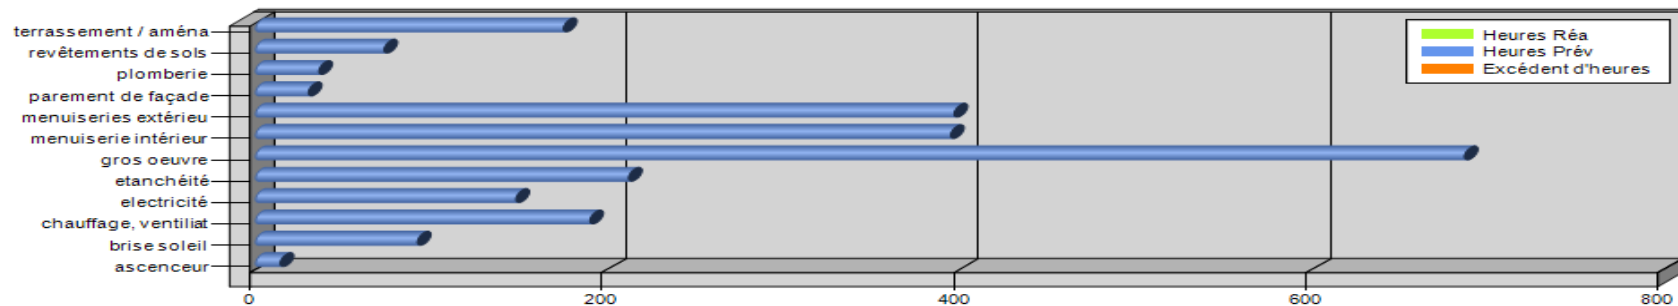

Etat d'avancement des marchés de l'opération du 17/09/2015 au 31/12/2016
