

Etat d'avancement des marchés de l'opération du 17/09/2015 au 31/12/2016

Opération : BRIEY_CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE CERTIFIE HQE_CTDD

Famille d'opération : Production

Nature d'opération : Travaux

Etat : En cours

Statut : Hors ANRU


Maitre d'ouvrage : Ville de Briey

Maitre d'ouvrage délégué :

Num Marché Clause	Marché Clause	Adjudicataire	Début	Fin	Heures Prévues	Heures réalisées sur la période	Heures Restantes	Dépassement d'heures	% Heures Réalisées / Prévues
01	Terrassement / aménagements extérieurs	EUROVIA LORRAINE - BRIEY	17/09/2015	31/12/2016	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00%
02	Gros oeuvre	WZ Construction	17/09/2015	31/12/2016	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00%
03	Etanchéité	-	17/09/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Menuiseries extérieures	LEFEVRE	17/09/2015	31/12/2016	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00%
05	Parement de façade	PRO FACADE SARL	17/09/2015	31/12/2016	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00%
06	Menuiserie intérieure, plâtrerie, faux plafonds	WUCHER MENUISERIE	17/09/2015	31/12/2016	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00%
07	Revêtements de sols et peinture	DEBRA FRERES	17/09/2015	31/12/2016	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00%
08	Chauffage, ventilation, climatisation	IDEX ENERGIES (Bar-le-Duc)	17/09/2015	31/12/2016	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%
09	Plomberie	LORRY	17/09/2015	31/12/2016	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00%
10	Electricité	EGIL	17/09/2015	31/12/2016	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00%
11	Ascenseur	KONE	17/09/2015	31/12/2016	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00%
12	Brise soleil	LEFEVRE	17/09/2015	31/12/2016	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00%
Total					2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00%

Etat d'avancement des marchés de l'opération du 17/09/2015 au 31/12/2016

Marchés

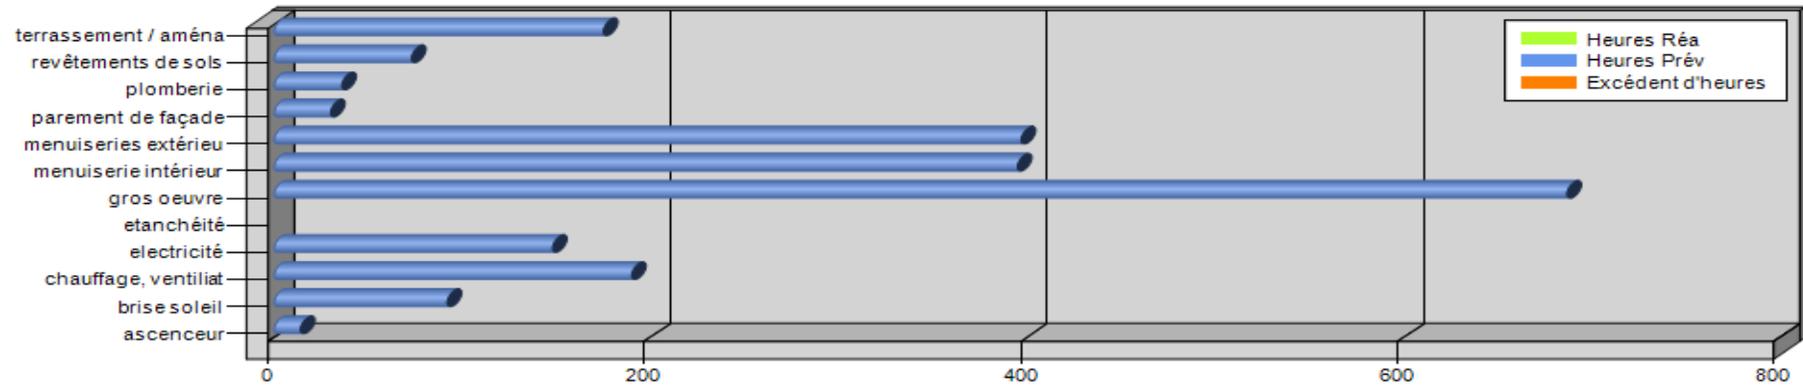

Opération clause

